

Iktatószám: **IKT-2017-302-I1-00007548**

Kedvezményezett neve: **Érd Megyei Jogú Város  
Önkormányzata**

Projekt címe: **Az Érd, Budai-Diósi út turbó  
körforgalmú csomópontjának fejlesztése**

Projekt azonosítószám:  
**VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95  
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4  
Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár  
Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390  
Adószám: 15303392-2-41

másrésről **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2030 Érd, Alsó utca 1-3.**  
Székhely: **2030 Érd, Alsó utca 1-3.**  
Azonosító szám (törzs-szám): **731256**  
Adószám: **15731254-2-13**  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **12001008-00209494-00100001**  
Aláírásra jogosult képviselője: **T. Mészáros András**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) VEKOP-5.3.3-17 Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden tárgyú felhívására Kedvezményezett **2017.05.18.** napon **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2017.10.19.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya **Az Érd, Budai-Diósi út turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **2030 Érd, Budai út (HRSZ: 22263)** cím alatt (Projekt fő helyszíne/a Szerződés melléklete szerinti helyszínen) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2018.05.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. január 1.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2018.09.30.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.03.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége **504 052 248 Ft**, azaz **ötszáznégymillió-ötvenkettőezer-kettőszáznegyvennyolc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **495 352 748 Ft**, azaz **négyszázkilencvenötmillió-háromszázötvenkettőezer-hétszáznegyvennyolc** forint.

A Projekt hatályos költségvetését – Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve – a Szerződés 1. melléklete tartalmazza

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **495 352 748 Ft**, azaz **négyszázkilencvenötmillió-háromszázötvenkettőezer-hétszáznegyvennyolc** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**,

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

#### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **495 352 748 Ft**, azaz **négyszázkilencvenötmillió-háromszázötvenkettőezer-hétszáznegyvennyolc** forint.

#### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **495 352 748 Ft**, azaz **négyszázkilencvenötmillió-háromszázötvenkettőezer-hétszáznegyvennyolc** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei a projektdokumentáció benyújtását és Támogató általi elfogadását követően Szerződésmódosítással felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek<sup>1</sup>.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

<sup>1</sup> Amennyiben releváns

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól<sup>2</sup>.

## 8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

*A támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható:*

1. *A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.*

*A Projekt tartalmi-műszaki előkészítése (tervezetten 1. sz.) mérföldköig teljesítendő támogatási feltételek:*

2. *A Kedvezményezettnek részletesen be kell mutatnia, hogy a projekt miként felel meg a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások általános feltételek 1. pontjának, különös tekintettel arra, hogy a projekt tervezése, megvalósítása során és a beruházást követően egyetlen fenntartható közlekedési mód a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban – kiemelt figyelemmel a gyengébb közlekedők érdekeire - sem kerül hátrányosabb helyzetbe, melyet jogszabályi hivatkozással nyilatkozatban igazolni is szükséges. A jelen projektnek nem része a kerékpárforgalmi létesítmény építése, azonban a közúti útpálya elhelyezését kérjük úgy kialakítani, hogy későbbiek folyamán biztosított legyen a gyalogjárda és kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése is.*

## 9. Záró rendelkezések

<sup>2</sup> Amennyiben releváns.

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

#### Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....	.....
-------	-------

<p><i>Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata</i> Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt ....., 201... év ..... hónap ... napján.</p>	<p><i>Nemzetgazdasági Minisztérium</i> <i>Regionális Fejlesztési Operatív Programok</i> <i>Irányító Hatósága</i> Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 201... év ..... hónap ... napján.</p>
--	---

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Projekt helyszíne
10. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeinként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

 Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**

 Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	376 104 526	101 548 222	477 652 748
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	2 362 205	637 795	3 000 000
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	1	314 961	85 039	400 000
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	3 149 606	850 394	4 000 000
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Nem elszámolható költség	1	6 850 000	1 849 500	8 699 500
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	4 236 987	1 143 986	5 380 973
Érd Megyei Jogú	Szakmai	Kötelezően előírt	Kötelezően	1	93 722	25 305	119 027



Város Önkormányzata	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	nyilvánosság biztosításának költsége	előírt nyilvánosság biztosításának költsége				
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	3 779 528	1 020 472	4 800 000
<b>ÖSSZKÖLTSÉG:</b>							<b>504 052 248</b>

.....  
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 201... év ..... hónap ...  
napján.

.....  
Nemzetgazdasági Minisztérium  
Regionális Fejlesztési Operatív Programok  
Irányító Hatósága  
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ...  
napján.

**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**

Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,00%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,00%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,00%
I/3. bankhitel	0	0,00%
II. egyéb támogatás	0	0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	495 352 748	100,00%
<b>Projekt elszámolható költsége</b>	<b>495 352 748</b>	<b>100,00%</b>
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	8 699 500	
Projekt teljes költsége	504 052 248	

.....  
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 201... év ..... hónap ...  
 napján.

.....  
 Nemzetgazdasági Minisztérium  
 Regionális Fejlesztési Operatív Programok  
 Irányító Hatósága  
 Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ...  
 napján.

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**

Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.05.15.	Az engedélyes szintű tervdokumentáció, a jogerős építési engedély és az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés (a pályázathoz már csatolásra került), valamint az engedélyes tervhez kapcsolódó közúti biztonsági audit ezen időpontig rendelkezésre fognak állni.
2.	2018.07.31.	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, mely eredményeként szerződéskötésre kerül sor.
3.	2018.09.30.	A közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelező fővállalkozási szerződés keretén belül elkészíti a kiviteli tervet, valamint elkészül a kiviteli tervhez kapcsolódó közúti biztonsági audit is. A mérföldkőben a projektmenedzsment személyi juttatása (33,33%) kerül még elszámolásra.
4.	2019.02.28.	A kivitelezési munkálatok 25 %-os készültségi szintjének elérése. A műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, valamint a kötelező nyilvánosság biztosítása.
5.	2019.05.31.	A kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi szintjének elérése. A projekt menedzsment (33,33%) és a műszaki ellenőri szolgáltatás igénybe vétele.
6.	2019.08.31.	A kivitelezési munkálatok 75%-os készültségi szintjének elérése és a műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele.
7.	2019.11.30.	A kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szintjének elérése. A projektmenedzsment (33,33%) és a műszaki ellenőri szolgáltatás igénybe vétele. A kötelező nyilvánosság biztosítása, valamint a közforgalom számára történő megnyitás előtti közúti biztonsági audit kerül elszámolásra.
8.	2019.12.31.	Ezen időpontra tervezzük a projekt fizikai befejezését. Ezen időpontig a részletes szakmai tartalomban leírt tevékenységek megvalósításra és befejezésre kerülnek.

.....  
**Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
 Kedvezményezett

.....  
**Nemzetgazdasági Minisztérium**  
**Regionális Fejlesztési Operatív Programok**  
**Irányító Hatósága**  
 Támogató

P.H.

Kelt ..... , 201... év ..... hónap ...  
napján.

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ...  
napján.

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**  
 Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
8.	Átépített, korszerűsített, felújított buszöböl száma	A tömegközlekedést használók érdekében biztonságos autóbusz öböl létesül.	2	db	
8.	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	A közlekedésbiztonság fokozása érdekében szilárd burkolattal felújított útszakasz létesül.	0,52844	km	

.....  
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 201... év ..... hónap ...  
 napján.

.....  
 Nemzetgazdasági Minisztérium  
 Regionális Fejlesztési Operatív Programok  
 Irányító Hatósága  
 Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ...  
 napján.

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**  
Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

NEM RELEVÁNS

.....  
*Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata*  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 201... év ..... hónap ...  
napján.

.....  
*Nemzetgazdasági Minisztérium*  
*Regionális Fejlesztési Operatív Programok*  
*Irányító Hatósága*  
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ...  
napján.

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**

Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Kedvezményezett/Konzorciumi tag mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, az alábbi hivatkozás alapján (a megfelelő hivatkozás kiválasztandó, aláhúzendó):

<b>Mentesség alapja a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján</b>	<b>Érintett Kedvezményezett / Konzorciumi tag neve</b>
84. § (1) bekezdés a) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés b) pontja alapján	
<u>84. § (1) bekezdés c) pontja alapján</u>	<b>Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>
84. § (1) bekezdés d) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés e) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés f) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés g) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés ha) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés hb) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés i) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés j) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés k) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés l) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés m) pontja alapján	

.....  
**Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 2017 év ..... hónap ...  
 napján.

## KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**  
Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

.....  
*Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata*  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 201... év ..... hónap ...  
napján.



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**  
 Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Az Érd Budai-Diósi út turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése - Kivitelezés	376 104 526 Ft	Kbt. 2. rész Uniós értékhatár szerinti 81. § alapján lefolytatott nyílt eljárás	-

.....  
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 201... év ..... hónap ...  
 napján.

**PROJEKT HELYSZÍNE**

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**  
 Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Irányító szám	Település neve	Közterület neve, jellege	Házszám (ha releváns)	Helyrajzi szám(ok)	Helyrajzi szám hiányában pontos területlehatárolás, vagy nyomvonalas létesítmény esetében az érintett közút száma és a beavatkozás kezdő-/végszelvényének száma
2030	Érd	Budai út	-	22263	-
2030	Érd	Diósdí út	-	19285	-

.....  
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 2017 év ..... hónap ... napján.

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A tervezési helyszínen történt forgalomszámlálási adatok alapján a jelenlegi kialakítás igen kapacitáshiányos, folyamatos, nem lebomló forgalmi dugók alakulnak ki, melyek a helyszíni bejárás és forgalomszámlálás során tapasztaltak szerint is visszaduzzaszt keleti és északi irányban a következő csomópontig. A forgalmi dugókat alapvetően az itt közlekedő nagyszámú jármű valamint a körforgalom keleti és északi ágában, keresztirányban közlekedő nagyszámú gyalogos forgalom okozza. A meglévő egysávos körforgalom turbó körforgalommá épül át, emiatt az egyes csomóponti ágak geometriája, a járdakapcsolatok, parkolók és útcsatlakozások módosításra kerülnek. A keleti és az északi csomóponti ág módosul nagymértékben, mivel 2 kilépő és 2 belépő sáv épül ki a belépő és kilépő sávok között gömbsüvegsort terveztünk beépíteni. A középszigeten a gyalogos mozgást meg kívántuk törni a nagyobb forgalombiztonság és kapacitás végett. A meglévő járdakapcsolatok átépítésre kerülnek, a szükséges taktilis jelzések kiépülnek, annak érdekében, hogy a közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékosokkal élők vagy bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitását segítse. A járható gyűrű, ferde parkolók és a középszigetek is térkő burkolatból épülnek ki, az útfelületek aszfalt burkolatot kapnak, a buszmegállók bazaltbeton burkolatból épülnek. A Diósdí út – Béke tér tengelytől keleti irányban található járdafelületek térkő burkolatot kapnak, a nyugati irányban található járdafelületek aszfalt burkolatot kapnak.

.....  
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 2017 év ..... hónap ... napján.

**KOMMUNIKÁCIÓS TERV**

 Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**

 Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**
**150-500 millió Ft támogatástartalom esetén:**

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeli ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó, Ft)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)					
A projekt megvalósítási szakasza (4-9.)					
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)					
1.	Kommunikációs terv készítése	2018. május	1	A projekt életútjához kapcsolódó kommunikációs tevékenységet, azok időbeli ütemezését és az eszközökhöz rendelt költségeket tartalmazó dokumentum.	nem elszámolható
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	2018. június	1	A <a href="http://www.erd.hu">www.erd.hu</a> oldalon tájékoztató megjelenítése	0
5a.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról	2018. június	1	¼ oldal terjedelmű hirdetés az Érdi Újság c. lapban 1 alkalommal; MTI-nek a közlemény megküldése	nem elszámolható
5b.	Sajtómegjelenések összegyűjtése	2018. június	1	A kiküldött sajtóközlemény által generálódott, vagy bármely a projekthez kapcsolódó sajtómegjelenés összegyűjtése	nem elszámolható
7a.	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2018. június	1	1 db 300cmx150cm méretű, „B” típusú műanyag tájékoztató tábla	64 390
9.	Kommunikációs célra alkalmas (professzionális!) fotódokumentáció készítése	2018. június	1	Legalább 4 alkalommal 3-3 db nagy felbontású, nyomdai felhasználásra alkalmas fénykép (min. 8 MP) (beruházási helyszín, események)	50 000
11a.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról	2019. december	1	¼ oldal terjedelmű hirdetés az Érdi Újság c. lapban 1 alkalommal; MTI-nek a közlemény megküldése	nem elszámolható
11b.	Sajtómegjelenések összegyűjtése	2019. december	1	A kiküldött sajtóközlemény által generálódott, vagy bármely a projekthez kapcsolódó sajtómegjelenés összegyűjtése	nem elszámolható

13.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2019. december	1	A <a href="http://www.palyazat.gov.hu">www.palyazat.gov.hu</a> oldalon TÉRKÉPTÉR térinformatikai kereső-adatbázis feltöltése a megvalósuló projekt adataival, fotókkal	nem elszámolható
14.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	2019. december	1	1 db 29,7cmx42,0cm méretű, „D” típusú, műanyag tájékoztató tábla	4 637

.....  
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 2017 év ..... hónap ...  
 napján.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**  
Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

.....  
*Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata*  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 2017 év ..... hónap ... napján.

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**  
 Kedvezményezett / Konzorciumi tag:<sup>3</sup> **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott T. Mészáros András, mint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjeként eljáró személy a **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003** azonosító számú, „**Az Érd, Budai-Diósi út turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés (Költségelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó- finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg – Utó- finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
<b>Projektelőkészítés költségei</b>	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	3 000 000	Utófinanszírozás	-	-
<b>Projektelőkészítés költségei</b>	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	4 000 000	Utófinanszírozás	-	-
<b>Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei</b>	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	4 800 000	Utófinanszírozás	-	-
<b>Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei</b>	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	119 027	Utófinanszírozás	-	-

<sup>3</sup> Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges.

<b>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</b>	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	477 652 748	Utófinanszírozás	-	-
<b>Projektmenedzsment költség</b>	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	5 380 973	Utófinanszírozás	-	-
<b>Projektelőkészítés költségei</b>	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentációk költsége	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentációk költsége	400 000	Utófinanszírozás	-	-
<b>Összesen:</b>			495 352 748			

.....

*Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett*

P.H.

Kelt ....., 2017 év ..... hónap ... napján.



**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)**

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.3-17-2017-00003**

Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

- Adóigazolás köztartozás mentességéről
- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 209/2017. (VII.10.) számú határozata az „Érd, Budai – Diósdai utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 113/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

.....  
*Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata*  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt ....., 2017 év ..... hónap ... napján.



Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága

---

Iktatószám: 3952519818/2017

Ügyintéző : Kertész Edit

Telefonszám: (24) 442-051

Ügyszám: 3841577066

## **ADÓIGAZOLÁS**

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendelkezéseimre álló dokumentumok - nyilvántartások, folyószámlák, bevallások - alapján igazolom, hogy

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**15731254-2-13**

**2030 ÉRD ALSÓ UTCA 1-3.**

adóalanyként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alappal a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.


Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozás, az adók módjára behajtható köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat.

SZIGETSZENTMIKLÓS, 2017. október 13.

Dr. Minya Mihály  
dandártábornok  
igazgató  
(hatáskör gyakorlója)

Hudecz László  
f osztályvezető -helyettes  
(kiadmányozó)

Ellenőrzési azonosító: 7314153022150791137928831



## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

209/2017. (VII.10.)

h a t á r o z a t a

az „Érd, Budai – Diósdí utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 113/2017. (IV.27.) határozat módosításáról


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Érd, Budai – Diósdí utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 113/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:


*„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érdén” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Budai – Diósdí utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Budai út – Diósdí út turbó körforgalmú csomópont fejlesztésére (hrsz.:19285, 22081/4, 22564, 22263, 22552/43, 19261/2, 19262), mindösszesen 504.052.248,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 495.352.748,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 8.699.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.*

*A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”*

**Határidő:** 30 nap

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

  
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

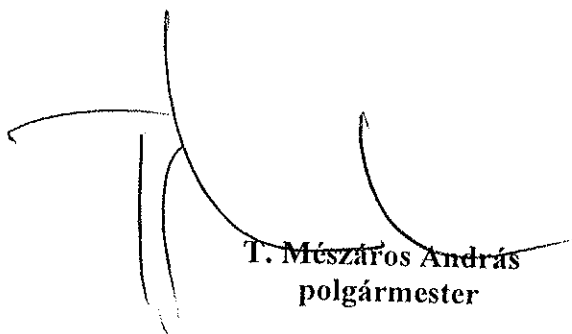  
T. Mészáros András  
polgármester
